		Totale investering	Financiering derden	Dekking gemeente regulier	Te dekken
1	**Historie als leitmotief**				
A	**Verbeelding historie: zichtbaar maken van historie in het straatbeeld**				
	Verbeelding van de historie, standbeeld Philips van Horne	€ 250.000	€ 200.000		€ 50.000
	Verbeelding van de historie, kunstwerk Stationsplein, omgezet naar sokkel standbeeld	€ 80.000			€ 80.000
	Verbeelding van de historie, fontein, herlabeld naar Streetwise	€ 50.000			€ 50.000
	Verbeelding van de historie, kiosk	€ 25.000			€ 25.000
	Verbeelding van de historie, waterput	€ 50.000			€ 50.000
B	**Renovatie / restauratie van cultuurhistorisch museum Jacob van Horne**	€ 2.217.500			€ 2.217.500
C	**Evenementenprogr.:10 evenementen p.j. met minimaal 5.000 bezoekers**	€ 132.000		€ 132.000	€ 0
D	**Vergroten toeristische en recreatieve beleving**				
	Culturele waarden, innovatie en lef (eenmalig) (5400202)	€ 70.000		€ 70.000	€ 0
2	**Verfraaiing binnenstad**				
A	**Herinrichting omgeving Bassin: 15.000 m²**	€ 1.740.000	€ 250.000	€ 0	€ 1.490.000
B	**Herinrichting en vergroening stadshart: 12.000m2**				
	Herstraten Stationsplein	€ 125.000		€ 125.000	€ 0
	Verbeterplan Stationsplein	€ 136.000		€ 136.000	€ 0
	Herinrichting Beekstraat tussen oude stadhuis en verlengde Beekstraat	€ 210.000		€ 210.000	€ 0
	Aanpak steegjes (Paradijsstraatje, Maasstraat/Walburgpassage en Meikoel/Van Berlo Straat) (BIZ)	€ 48.000	€ 43.000	€ 5.000	€ 0
	Verlichting steegjes	€ 5.000			€ 5.000
	herinrichting Oude Markt /Korenmarkt (o.a. voegvullingen P21007824 (2016) € 100.000-,-, ondergrond, vergroening)	€ 140.000		€ 140.000	€ 0
	Aanlichten Martinuskerk	€ 165.000			€ 165.000
	Sfeerverlichting binnenstad vanaf winter 2018/2019	€ 75.000	€ 25.000		€ 50.000
	Verfraaiing Oelemarkt (plan moet nog gemaakt worden, wordt waarschijnlijk groen)	€ 25.000			€ 25.000
	Herinrichting Smeetspassage	€ 150.000		€ 150.000	€ 0
	Herinrichting Hegstraat	€ 100.000		€ 0	€ 100.000
	Meer vergroening binnenstad	€ 150.000			€ 150.000
	Verbeteren stabiliteit (dekking) en sterkte Wifi-netwerk binnenstad	€ 7.500			€ 7.500
	Gevelfonds	€ 300.000			€ 300.000
C	**Verbeteren van spelaanleidingen**	€ 150.000			€ 150.000
3	**Klimaatbestendige veerkrachtige stad**				
A	**Realiseren van 950 m² aan retentievoorzieningen (singel) = Muntcomplex**	€ 750.000			€ 750.000
	Programmamanager/advieskosten	€ 100.000			€ 100.000

		Totale investering	Financiering derden	Dekking gemeente regulier	Te dekken
B	**350 extra fietsenstallingen en 4 laadpalen voor elektrische fietsen**	€ 160.000		€ 160.000	€ 0
C	**Verhogen aantrekkelijkheid en verbeteren van de (lucht)kwaliteit in en rondom 6 parkeergarages**				
	Verbeteren verlichting Muntgarage (vervangingsinvestering)	€ 60.000		€ 60.000	€ 0
	Verbeteren verlichting parkeergarage Walburgpassage (vervangingsinvestering) zie rij 49	€ 35.000		€ 35.000	€ 0
	Verbeteren luchtkwaliteit parkeergarages (6 x € 62.000) P21402226 (2017)	€ 372.000		€ 62.000	€ 310.000
	Slagboominstallatie parkeergarage oude stadhuis P21401826 (2016)	€ 110.000		€ 110.000	€ 0
	Vervanging slagboominstallaties Ursulinegarage en Walburg/Kromstraatgarage	€ 50.000		€ 50.000	€ 0
	Opknappen parkeergarages (beschildering) (vervangingsinvestering) zie rij 49	€ 243.000		€ 243.000	€ 0
	Afsluitpalen P21105124 (2016)	€ 100.000		€ 100.000	€ 0
4	**Functietransformatie en compact kernwinkelgebied**				
A	**Transformatie leegstaande panden particulieren: 4.527 m² commerciële ruimte, terugbrengen leegstand**				
	Beekstraat 70	€ 337.500	€ 337.500		€ 0
	Beekstraat 73	€ 0	€ 0		€ 0
	Hegstraat 6-8	€ 25.000	€ 25.000		€ 0
	Maasstraat 8A, 8B		€ 0		€ 0
	Oud Kerkhof 2		€ 0		€ 0
	Walburgpassage 40	€ 8.000	€ 8.000		€ 0
	Sint Raphaelpad 22,24,26	€ 50.000	€ 50.000		€ 0
	Stationsstraat 16	€ 2.106.808	€ 2.106.808		€ 0
	Maasstraat 28	€ 400.000	€ 400.000		€ 0
	Langstraat 20	€ 400.000	€ 400.000		€ 0
	Hoogstraat 21/Hegstraat 24	€ 40.000	€ 40.000		€ 0
	Maaspoort 8	€ 425.000	€ 425.000		€ 0
	Stationsstraat, plint BPD				€ 0
B	**Herbestemming gemeentelijk vastgoed**				
	Archiefbewaarplaats in nieuwe stadhuis P54103423 (2015)	€ 850.000		€ 850.000	€ 0
	Studiezaal en kantoren in Bibliocenter P54103423 (2015)	€ 165.000		€ 165.000	€ 0
	C'wartier, omzetting kantoor naar kleine bedrijfjes	€ 300.000		€ 300.000	€ 0
	HBO Nederland (aankoop en renovatie door RICK)	€ 1.400.000	€ 900.000		€ 500.000
	Totaal	**€ 14.888.308**	**€ 5.210.308**	**€ 3.103.000**	**€ 6.575.000**

Voortgangsrapportage februari 2020 - gemeente Weert - financieel stand van zaken per ultimo 2019

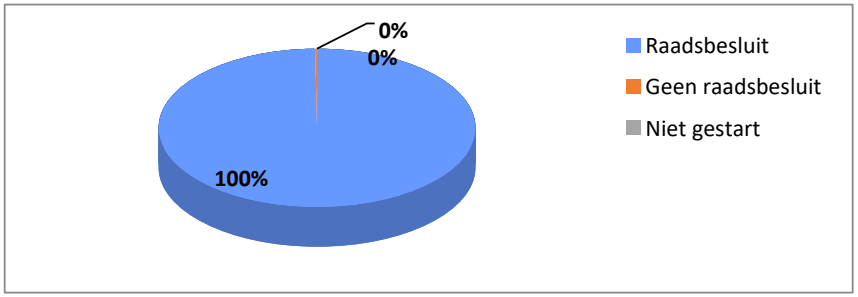

Nog naar Raad moeten:
- Oelemarkt, € 25.000

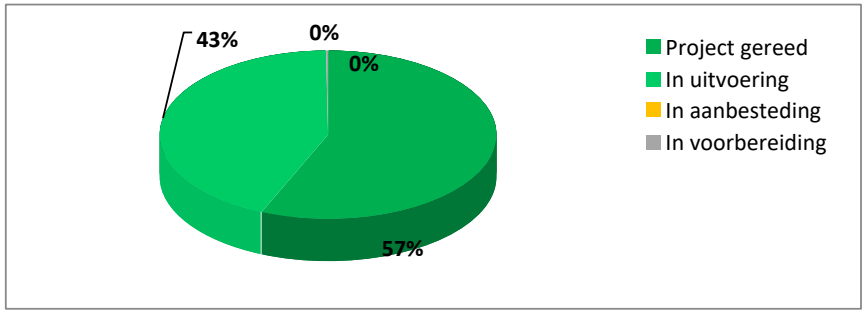

Voornaamste projecten in voorbereiding:
- verkoop verdiepingen Muntcomplex in voorbereiding
- vergroening Oelemarkt

	Resultaat beschikking	Begroot €	Realisatie per 1-1-2020 €	T.o.v. planning	Toelichting
1	Historie als leitmotief				
A	**Verbeelding historie: zichtbaar maken van historie in het straatbeeld**	€ 298.320	€ 285.044		Standbeeld gereed november 2018, sokkel wordt in opdracht gegeven, waterput is in voorbereiding, realisatie in 2020. Kiosk is gereed.
B	**Renovatie / restauratie van cultuurhistorisch museum Jacob van Horne**	€ 5.135.670	€ 2.092.387		Raad heeft besluit genomen tot investeren van € 5,1 mln (i.p.v. € 2,5 mln). Aanbesteding heeft plaats gevonden. Gereed Q4 2020.

C	**Evenementenprogr.:10 evenementen p.j. met minimaal 5.000 bezoekers**	€ 247.156	€ 247.156		Gerealiseerd: 14 evenementen in 2017 en 18 evenementen in 2018 (details zie 1e en 2e rapportage gemeente)
D	**Vergroten toeristische en recreatieve beleving**	€ 188.299	€ 188.299		Gerealiseerd: tal van kleinere evenementen in 2017 en in 2018 (details zie 1e en 2e rapportage gemeente)
2	**Verfraaiing binnenstad**				
A	**Herinrichting omgeving Bassin: 15.000 m²**	€ 1.798.680	€ 1.798.680		Gerealiseerd, opgeleverd in november 2017 (incl 12 bomen)
B	**Herinrichting en vergroening stadshart: 12.000m2** **Gevelfonds inrichten + spelaanleidingen realiseren.**	€ 2.042.717	€ 1.862.790		Diverse projecten zijn gerealiseerd, incl 22 plantschalen/boombakken. Regeling Gevelfonds is op 23 nov 2017 vastgesteld in Raad.
				10.910	m2 herinrichting gerealiseerd
				46	bomen gerealiseerd
				22	plantschalen/boombakken gerealiseerd
				1.377	m2 vergroening gerealiseerd
3	**Klimaatbestendige veerkrachtige stad**				
A	**Realiseren van 950 m² aan retentievoorzieningen (singel)**	€ 440.000	€ 440.000		Bestuurlijk is besloten 440K uit dit budget te voorfinancieren naar gevelfonds t.b.v. aanpassing gevels Muntcomplex om zodoende Bouwinvest te stimuleren tot investeringen in het Muntcomplex. Raad heeft besloten om geen singelvisie op te stellen.
B	**350 extra fietsenstallingen en 4 laadpalen voor elektrische fietsen**	€ 134.361	€ 134.361		Projecten zijn gerealiseerd: 417 stuks extra fietsenstallingen en 5 laadpalen voor fietsen.

				5	**Laadpalen gerealiseerd.**
				417	**Fietsenstallingen gerealiseerd**
C	**Verhogen aantrekkelijkheid en verbeteren van de (lucht)kwaliteit in en rondom 6 parkeergarages**	€ 900.951	€ 900.951		Luchtzuiveringsinstallaties zijn gerealiseerd.
				3	**parkeergarages gereed v.w.b. verhogen aantrekkelijkheid**
				6	**parkeergarages gereed v.w.b. luchtzuiveringsinstallatie**
4	**Functietransformatie en compact**				
A	**Transformatie leegstaande panden particulieren: 4.527 m² commerciële ruimte naar 58 woningen. Terugbrengen leegstand**	€ -	€ -		Op 19 locaties heeft de transformatie reeds plaatsgevonden: tot op heden is 5.942 m² getransformeerd naar 77 woningen. In de pijplijn is 10.249 m² transformatie naar 152 woningen
				7.003	**m2 getransformeerd**
				155%	**gerealiseerde transformatie**
B	**Herbestemming gemeentelijk vastgoed (en realisatie 25 sociale huurwoningen)**	€ 1.817.917	€ 1.717.917		Alle de vier onderdelen zijn gerealiseerd (archiefbewaarplaats, studiezaal, C'wartier, RICK). In Q4 2019 heeft gemeente 2e etage Muntcomplex in de markt gezet t.b.v. woning-realisatie
	Onderzoeksbudget	€ 80.000	€ 76.636		Diverse onderzoeks- en advieskosten
		€ 13.084.071	**€ 9.744.221**		
