

Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: 25107	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Peter Verheijen    Tel.: (0495) 57 54 66	
Portefeuillehouder(s)	: G.J.W. Gabriëls	Nummer B&W-advies: BW-008673

**ONDERWERP**

Subsidie project Duurzame energieopwekking Zwembad de IJzeren Man.

**ADVIES**

Instemmen met bijgaand verzoek aan de Provincie Limburg om over te gaan tot vaststelling van de subsidie Duurzame energieopwekking Zwembad de IJzeren Man

**TOELICHTING**

Relatie met vorig voorstel:

B&W besluit van 17 maart 2015 om ingediende bezwaarschrift in te trekken.

Algemeen:

In 2009 is door de Provincie Limburg een subsidie van € 60.000,- verstrekt voor het project "Duurzame energie opwekking Zwembad De IJzeren Man". Concreet betrof het de realisatie van een houtverbrandingsinstallatie en de vervanging van de luchtbehandelingskasten en het energiebeheersysteem.

In 2010 bleek dat de kosten voor de realisatie van de houtverbrandingsinstallatie veel hoger waren dan voorzien. Door de raad is daarom in november 2010 besloten het project te wijzigen en in plaats van een houtverbrandingsinstallatie een nieuwe warmtekrachtkoppelinginstallatie te plaatsen.

De Provincie is toen door de gemeente in januari 2011 geïnformeerd over de inhoudelijke wijziging van het project en een wijziging van de doorlooptijd. De gemeente heeft toen verzocht de subsidie voor het project te handhaven. Na een eerdere afwijzing heeft de Provincie op 27 mei 2014 besloten om de subsidie van € 60.000,- te handhaven voor het gewijzigde project. Waarna op 5 maart 2015 is aangegeven dat het verzoek om vaststelling van de subsidie vóór 1 september 2015 dient te worden ingediend.

Weert, 28 juli 2015  De directeur		S		B	W	W	W	W
					HL	FvE	PS	GG
			akkoord					
			bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 25 augustus 2015								

**In te vullen door het B&W secretariaat:**

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

Beslissing d.d.: 25/08/2015.

Nummer: 8

  
 De secretaris,  
 Totaal aantal pagina's: 2  
 Pagina 1

Bijgaand de brief aan de provincie Limburg met daarbij het verzoek de subsidie vast te stellen op € 60.000,-.

Argumenten:

n.v.t.

Kanttekeningen:

n.v.t.

**JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)**

Vaststellingsverzoek dient voor 1 september 2015 te zijn ingediend.

**FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**

Het subsidiebedrag komt ten gunste van het krediet dat ter beschikking is gesteld voor de energiemaatregelen.

**COMMUNICATIE/PARTICIPATIE**

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Niet van toepassing

*Nadere specificatie:*

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

*Nadere specificatie:*

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

**OVERLEG GEVOERD MET**

Intern:

Jacco Meijer, financieel consulent

Extern:

n.v.t.

**BIJLAGEN**

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Postbus 5700  
6202 MA MAASTRICHT

Weert, 25 augustus 2015

Onderwerp : Project Duurzame energieopwekking Zwembad de IJzeren Man  
Uw kenmerk : 2015/14423 SAS-2012-02027  
Ons kenmerk : 25107

Geacht college,

U heeft aan de gemeente Weert een subsidie toegekend voor het project Duurzame energieopwekking Zwembad De IJzeren Man. Met deze brief verzoeken wij u om over te gaan tot vaststelling van de subsidie.

#### **Verlening**

Bij brief van 9 september 2009 heeft u een projectsubsidie verleend van € 60.000,- ten behoeve van het project. Na een verzoek van onze kant heeft u bij brief van 2 juni 2014 ingestemd met het gewijzigde projectplan en het subsidiebedrag in stand gehouden.

In uw brief van 6 maart 2015 heeft u aangegeven akkoord te gaan verlenging van de uitvoeringstermijn. De uiterste datum van het indienen van het verzoek tot vaststelling is daarbij op 1 september 2015 gesteld.

#### **Vaststelling**

Als bijlage treft u een eindverslag aan met daarbij de goedkeurende verklaring van de accountant. Wij verzoeken u dan ook om de subsidie overeenkomstig de verlening vast te stellen op € 60.000,-.


U kunt dit bedrag overmaken naar IBAN rekeningnummer NL13 BNGH 02 85 00 93 03 van de gemeente Weert onder vermelding van 'subsidie Duurzame energie IJzeren Man (P53009326)'.

#### **Tot slot**

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Peter Verheijen van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 57 54 66 en per e-mail op [P.Verheijen@weert.nl](mailto:P.Verheijen@weert.nl).

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

  
M.H.F. Knaapen  
gemeentesecretaris

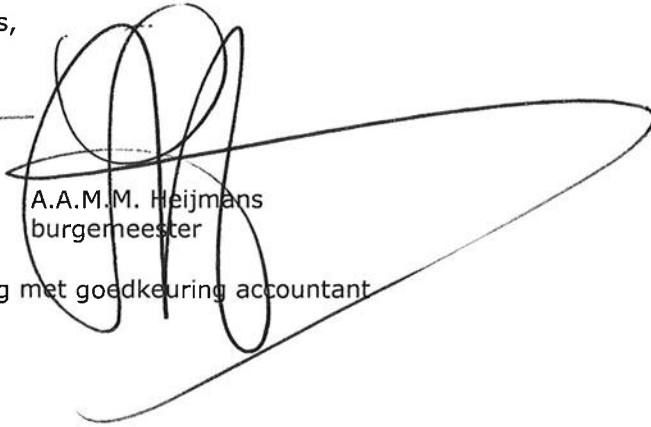  
A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

Bijlage(n) : Eindverslag met goedkeuring accountant

## **Eindverslag m.b.t. subsidie duurzame energieopwekking Zwembad De IJzeren Man**

### Inleiding

Op 8 september 2009 is door de Provincie Limburg een subsidie van maximaal € 60.000,00 toegekend voor een realiseren van duurzame energieopwekking bij Zwembad De IJzeren Man. Met de besluiten van 27 mei 2014 en 5 maart 2015 heeft de Provincie ingestemd met het wijzigen van het plan en de uitvoeringstermijn (31 juli 2014). In dit verslag wordt de uiteen gezet hoe het project uiteindelijk is afgerond.

### Oorspronkelijk plan

Het project bestond uit twee onderdelen:

- a. Het realiseren van een houtverbrandingsinstallatie bij het zwembad en het vervangen van de luchtbehandelingskasten van het zwembad.
- b. Inzet van gemeentelijk snoeiafval als groene brandstof.

De houtverbrandingsinstallatie diende als vervanging van de oude WKK-installatie van het zwembad.

In juni 2010 werd de houtverbrandingsinstallatie aanbesteed. De uitkomst hiervan was een dusdanige overschrijding van het beschikbare budget, dat gekozen werd voor stopzetting van de aanbesteding.

### Wijziging project

Uiteindelijk is besloten om helemaal af te zien van de realisatie hiervan. De gemeenteraad van Weert heeft in november 2010 besloten om de WKK installatie te vervangen door een nieuwe WKK installatie in combinatie met een warmtepomp.

In januari 2011 is aan de Provincie Limburg het verzoek gedaan om de toegekende subsidie te handhaven. Dit gezien de al gemaakte kosten in het project en de waarde van het project (voorbeeldfunctie). Daarnaast werd in dit project wel verder ingezet op duurzaamheidsmaatregelen.

De in het oorspronkelijk plan opgenomen vervanging van de luchtbehandelingskasten werd gehandhaafd evenals de aanpassing van het energiebeheerssysteem. Van de plaatsing van een warmtepomp is uiteindelijk afgezien omdat dit na nader onderzoek niet rendabel bleek.

### Uitvoering

In oktober 2011 is de WKK installatie geplaatst. In 2012 werden de luchtbehandelingskasten aanbesteed. Doordat de kosten een stuk hoger uitvielen dan begroot is in 2013 opnieuw aanbesteed. Er toen gekozen voor vervanging in twee fases. Fase 1 in de zomer van 2013 en fase 2 in het voorjaar 2014.

De aanpassing van het energiebeheerssysteem is door het zwembad in 2013 en 2014 uitgevoerd. In juni 2014 is het project volledig afgerond.


2015 is het eerste volledige jaar waarin alle maatregelen zijn uitgevoerd en het maximale voordeel uit de uitgevoerde maatregelen gehaald kan worden. Er is op dit moment nog geen zicht op behaalde voordelen in de exploitatie door verminderd energiegebruik.

<b>Gewijzigde begroting 2012</b>		
voorbereiding houtverbranding	€	63.959,27
realisatie WKK	€	197.751,50
vervanging luchtbehandelingskosten	€	340.357,50
Aanpassing energiebeheerssysteem	€	20.000,00
	<b>€</b>	<b>622.068,27</b>

<b>Daadwerkelijke kosten</b>		
voorbereiding houtverbranding	€	52.954,27
realisatie WKK	€	177.522,00
vervanging luchtbehandelingskosten	€	392.884,43
aanpassing energiebeheerssysteem	€	24.000,00
<b>Totaal</b>	<b>€</b>	<b>647.360,70</b>

P. Verheijen  
Afd. OCSW  
Gemeente Weert

Bij afwezigheid:



Ella Croonenberg  
Directeur Inwoners
